



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**
ул. Первомайская, 6, г. Кирово-Чепецк., 613040, тел.: (83361) 4-91-37,
E-mail: ksk_adm@mail.ru

Утверждено
распоряжением председателя
Контрольно-счетной комиссии
от 20.10.2022 № 41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по итогам проведения мониторинга реализации региональных
(национальных) проектов за 9 месяцев 2022 года**

№ 51

от 20.10.2022

В соответствии с пунктом 15 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии района на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии района от 20.12.2021 № 07, Контрольно-счетной комиссией Кирово-Чепецкого района проведен мониторинг реализации проектов за 9 месяцев 2022 года.

Анализ расходов, направленных на реализацию региональных (национальных) проектов

В 2022 году на территории Кирово-Чепецкого района в рамках 3-х региональных (национальных) проектов, реализуется 6 федеральных проектов (далее — проекты).

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2022 году проектов за счет консолидированного бюджета Кирово-Чепецкого по состоянию на 01.07.2022 составил 14364,9 тыс. рублей.


Решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 17.12.2021 № 04/30 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения от 29.06. №10/76) на реализацию проектов предусмотрено 8589,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 727,6 тыс. рублей, областного бюджета 1825,58 тыс. рублей, местного бюджета — 36,3 тыс. рублей.

Средства на реализацию национального проекта «Жильё и городская среда» предусмотрены решением:

- Бурмакинской сельской Думы от 24.12.2021 № 48/171 «О бюджете Бурмакинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» (с изменениями) в сумме 1469,8 тыс. рублей;

- Кстининской сельской Думы от 23.12.2021 № 44/207 «О бюджете Кстининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» (с изменениями) в сумме 4305,6 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2022 году на реализацию региональных (национальных) проектов, тыс. рублей

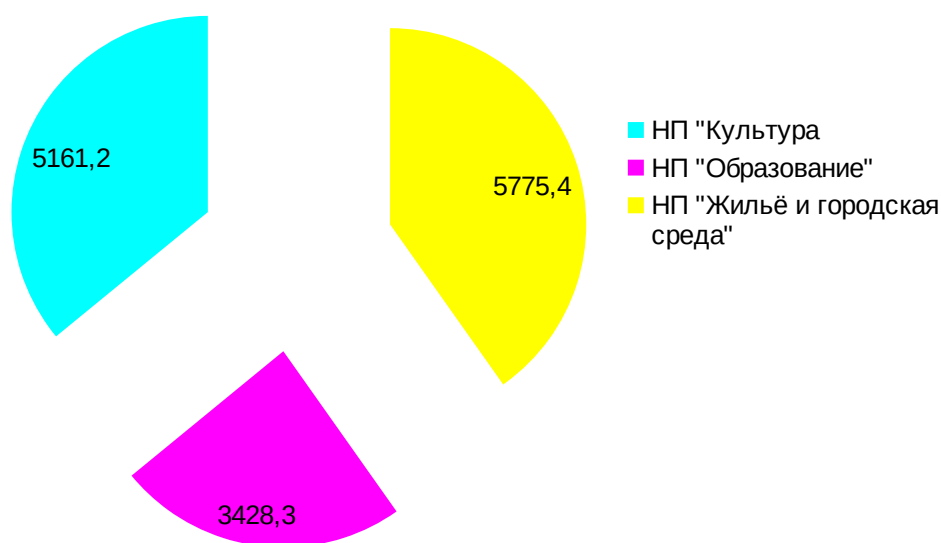

Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 9 месяцев 2022 года составили 11823,42 тыс. рублей, или 82,3% от годового плана.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование проекта	Плановые назначения				Исполнено в 1 полугодии	% исполнения
		Всего	в том числе: федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		
Национальный проект «Культура»							
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области"							
1	«Культурная среда» (Создание модельных муниципальных библиотек)	5000,0	5000,0	0	0	5000,0	100
2	«Творческие люди»	161,2	150,0	9,58	1,62	161,2	100
	Итого НП «Культура»	5161,2	5150,0	9,58	1,6	5161,2	100

Национальный проект «Образование»							
Региональный проект «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области»							
3	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	1609,7	1577,62	15,98	16,1	1609,7	100
Национальный проект «Образование», федеральный проект «Современная школа»							
4	Современная школа	1818,6	0	1800,0	18,6	1818,6	100
	Итого НП «Образование»	3428,3	1577,6	1816,0	34,7	3428,3	100
Национальный проект «Жильё и городская среда»							
5	Сокращение непригодного для проживания жилья	2540,014	2514,7	22,9	2,54	1557,1	61,3
региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»							
6	Комфортная городская среда	3235,25	3170,87	32,03	32,35	3145,8	97,2
	Итого НП «Жильё и городская среда»	5775,4	5685,57	54,93	34,89	4702,9	81,4
	Всего по региональным (национальным) проектам	14364,9	12413,17	1880,5	71,19	13292,4	92,5

Освоение бюджетных средств за 9 месяцев текущего года в объеме 100% от первоначального плана достигнуто при реализации национальных проектов «Культура» и «Образование», в том числе:

1) «Культура»:

- в рамках федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("**Творческие люди**") по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры, по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры в сумме 161,2 тыс. рублей или 100% плановых назначений,

- в рамках федерального проекта «**Культурная среда**», с объемом финансирования 5 000,0 тыс. рублей, предусмотрено создание модельной библиотеки п. Ключи Кирово-Чепецкого района Кировской области, кассовое исполнение составило 100% от плановых назначений;

2) «Образование»:

- по реализации мероприятий по подготовке общеобразовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности **«Точка роста»** в рамках федерального проекта **«Современная школа»** в сумме 1818,6 тыс. рублей или 100% плановых назначений,

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для **занятий физической культурой и спортом** в сумме 1609,7 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

За 9 месяцев текущего года освоение бюджетных средств в рамках национального проекта **«Жильё и городская среда»** составило 4702,9 тыс. рублей или 81,4% плановых назначений, в том числе:

1) реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселение граждан из **непригодного для проживания жилья** исполнены в сумме 1557,1 тыс. рублей или на 61,3%,

2) реализация мероприятий в рамках формирования современной городской среды в сумме 3145,8 тыс. рублей или 97,2%.

В период с февраля по 25 июля текущего года для освоения бюджетных средств заключено 42 контракта (договора) на сумму 13222,4 тыс. рублей, в том числе:

- НП «Культура» заключено 13 контрактов (договоров) на сумму 5091,24 тыс. рублей или 98,6% от общего объема финансового обеспечения реализации проекта. На сумму 69,96 тыс. рублей заключение контрактов не предусматривается;

- НП «Образование» - 26 контрактов (договора) на сумму 3428,3 тыс. рублей или 100% от общего объема финансового обеспечения реализации проекта;

- НП «Жильё и городская среда» - 6 контрактов (договоров) в рамках проекта «Комфортная городская среда» на сумму 4702,9 тыс. рублей или 81,4% от общего объема финансового обеспечения реализации проекта.

Проверка соблюдения сроков (графиков) выполнения работ, услуг в рамках исполнения региональных проектов, предусмотренных контрактами (договорами).

I. Проведена последующая проверка по факту устранения нарушений, выявленных в ходе мониторинга национальных проектов за 1 полугодие текущего года по реализации мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда»:

I.I. в Бурмакинском сельском поселении:

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» в Бурмакинском сельском поселении заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству площадки Сквера Победы «Набат» с обществом с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА ГРУПП».

При визуальном осмотре по состоянию на 24 июля текущего года на месте благоустройства площадки по адресу: Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-он с.Бурмакино ул.Советская д.1г, было установлено, что произведены работы только по срезке кустарников и выравниванием грунта.

На оказание услуг по монтажу уличного освещения на территории Сквера Победы «Набат», заключен договор с ИП Огородов А.Г. По состоянию на 24 июля работы по монтажу уличного освещения работы не начаты.

Проведена повторная проверка исполнения работ по устройству сквера Победы с выездом на объект **по состоянию на 06.10.2022 года**. Проверкой установлено:

- в рамках муниципального контракта № 03402000033220021040001 от 04.04.2022 года на выполнение работ по благоустройству площадки Сквера Победы «Набат» с обществом с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА ГРУПП» на месте благоустройства площадки по адресу: Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-он с.Бурмакино ул.Советская д.1г работы выполнены — произведена укладка бетонных плитных тротуаров типа «Брусчатка». Проверке представлены акт приемки работ от 13.09 2022 года, акт выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3 от 13.09.2022 года (отчетный период с 04.04.2022 по 13.09.2022), счет-фактура № 1 от 13.09.2022 в сумме 1440,0 тыс. рублей. Оплата работ произведена платежными поручениями № 563 от 19.09.2022 в сумме 152989,94 рублей и № 569 от 26.09.2022 в сумме 1287010,06 рублей.

Фактически работы выполнены с нарушением сроков на 14 дней, установленных пунктом 6.1. муниципального контракта, в связи с чем администрацией сельского поселения письмом от 14.09.2022 года № 155 выставлено требование об уплате неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом в сумме 5226,62 рублей. Оплата неустойки поступила на счет администрации сельского поселения платежным поручением от 03.10.2022 № 160 в полном объеме.

- в рамках договора № 3 от 25.03.2022 года на оказание услуг по монтажу уличного освещения на территории Сквера Победы «Набат» с ИП Огородов А.Г. в сумме 182000,0 рублей произведены электромонтажные работы, установлены 8 светильников, согласно техническому заданию. На проверку представлены акт выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3 от 22.08.2022 года (отчетный период с 25.03.2022 по 25.03.2022) в сумме 182,0 тыс. рублей, счет 68 от 22.08.2022 года.

Согласно части 3.2. вышеуказанного договора № 3 от 25.03.2022 года оплата услуг «Заказчика» производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 7 (семи) рабочих дней после выставления счета «Исполнителем» и подписания акта о приемке оказанных услуг Сторонами, то есть не позднее 31 августа. Фактически оплата выполненных произведена с нарушением срока, установленного частью 3.2 договора, платежным поручением № 559 от 21.09.2022 в полном объеме. Претензии со стороны исполнителя не поступало.

I.П. в Кстининском сельском поселении:

I.П.I. Общая стоимость проекта по обустройству спортивного комплекса на стадионе с. Кстинино составляет — 1765 455,0 рублей.

Бюджетные средства в рамках муниципального контракта № 03040200003322001403 от 25.03.2022 года с Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная торговая компания» в сумме 1 676 833,0 рублей освоены (отчетный период с 25.03.2022 по 21.06.2022 года) в 1 полугодии.

На сэкономленные средства от проведения электронного аукциона, заключен прямой муниципальный контракт № 3-2022 с ООО «Мир металла и камня» на устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня на баскетбольной площадке в рамках благоустройства общественной территории по обустройству спортивного комплекса на стадионе с. Кстинино, ул. Спортивная 2а от 19.07.2022 в сумме 142,749 тысяч рублей. Согласно части 1.3. - 1.4. муниципального контракта № 3-2022, начало выполнения работ - с момента подписания Контракта, окончание — 30.09.2022 года.

На проверку представлено письмо от ООО «Мир металла и камня» в лице директора Беженцевой Натальи Николаевны от 28.09.2022 года №2 с просьбой перенести срок окончания работ до 10 октября текущего года, в связи с форс-мажорными обстоятельствами (срочной мобилизацией работников на данном объекте).

В нарушение статьи 451, 452 Гражданского кодекса Российской Федерации дополнительное соглашение об изменении срока окончания работ исполнения муниципального контракта № 3-2022 от 19.07.2022 года не составлялось и сторонами не подписывалось, тем самым не достигнуто соглашения сторон.

11.10.2022 года мной, председателем Контрольно-счетной комиссии Кирово-Чепецкого района Пориной Н.А., совместно с главой Кстининского сельского поселения Вотинцева А.А. проведена выездная проверка на баскетбольную площадку в рамках благоустройства общественной территории по обустройству спортивного комплекса на стадионе с. Кстинино, ул. Спортивная 2а. В ходе проверки установлено, что работы по обустройству выравни-

нивающих слоев оснований из щебня не завершены, тем самым Подрядчиком нарушена часть 1.4. муниципального контракта № 3-2022 от 19.07.2022 года.

Претензия со стороны «Заказчика» - администрации Кстининского сельского поселения в адрес «Исполнителя» - ООО «Мир металла и камня» о предъявлении штрафных санкций не направлена, что является нарушением 5.2-5.5.13 муниципального контракта. По состоянию на 11 октября размер неустойки, подлежащий к зачислению в бюджет Кстининского сельского поселения составляет:

Цена контракта - 142,749 рублей,

срок выполнения контракта — 30.09.2022 года

Размер ставки рефинансирования на 30.09.2022 года - 8,0%.

Расчет за каждый день просрочки: $142\,749,0 \text{ рублей} * 8\% / 300 = 38,1 \text{ рублей}$.

Расчет за 11 дней составит: $38,1 \text{ рублей} * 11 \text{ дней} = 419,1 \text{ рублей}$.

Кроме того, в нарушение части 3.2.е) соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды из областного бюджета местному бюджету от «31» января 2022 г. № 33618420-1-2022-001, локальный сметный расчет № 5/2 от 17.07.2022 на обустройство спортивного комплекса на стадионе с.Кстинино ул.Спортивная 2а на сумму 142,749 тысяч рублей, проверке достоверности определения сметной стоимости не подвергался.

I.П.П. Национальный проект «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019-2025 годы», направленной на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Кстининском сельском поселении:

Объем финансирования, предусмотренный решением Кстининской сельской Думы от 23.12.2021 № 44/207 «О бюджете Кстининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» (с изменениями) в рамках Соглашения № 12-2022/А от 02.02.2022 года на переселение граждан из аварийного жилья составляет 2540140,0 рублей (приобретение трех квартир, общая площадь 68,7 кв. м.).

Сроки приобретения жилых помещений - 31.12.2021 года.

На момент проведения мониторинга 2 квартиры переданы в собственность граждан, расположенных по адресу:

- Кирово-Чепецкий район, с. Кстинино, улица Профсоюзная, дом 14, квартира 7, общая площадь 26,3 кв. метр, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 26.09.2022 года;

- город Киров, Ленинский район, мкр. Лянгасово, улица Октябрьская, дом 45, корпус 3, квартира 28, общая площадь 26,1 кв. метр., согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 21.09.2022 года

Квартира, расположенная по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Кстинино, ул.Советская, 69, кв.2, согласно заключению межведомственной комиссии № 8 от 25.12.2012 года, признана непригодной для проживания и подлежит сносу. На сегодняшний день данная квартира принадлежит на праве собственности гражданину Ганиеву М.М.

Администрацией сельского поселения проведена экспертиза выкупной цены квартиры для возмещения гражданину Ганиеву М.М. в качестве компенсации на приобретение жилья. Согласно экспертному заключению к отчету об оценке № Ц-250 на жилое помещение, общей площадью 23,1 кв. метр, выкупная стоимость составила 57 700,0 рублей.

Администрацией сельского поселения в адрес гражданина Ганиева М.М. 12.09.2022 года направлено соглашение об изъятии квартиры, расположенной по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Кстинино, ул.Советская, 69, кв.2 в муниципальную собственность и акт приема-передачи с целью выплаты ему соответствующей компенсации.

Поскольку сторонами соглашение не достигнуто, администрация Кстининского сельского поселения направила исковое заявление в суд.

II. Проведена проверка достижения результатов реализации мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Между Министерством образования Кировской области и администрацией Кирово-Чепецкого района заключено соглашение о предоставлении бюджету Кирово-Чепецкого района из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от «28» января 2022 года № 5-ТР.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Кирово-Чепецкого района утвержден решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 17.12.2021 № 04/30 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов» в рамках финансирования федерального проекта «Современная школа», составляет 1818,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета — 1800,0 тыс. рублей,
- местного бюджета -18,6 тыс. рублей.

II. Проверка освоения бюджетных средств в рамках проекта проведена в МКОУ ООШ с. Полом:

1) Между МКОУ ООШ с. Полом в лице директора Смирновой А.В. и ООО Компания «Азбука» в лице директора Деришева А.В. в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 № 44-ФЗ заключен договор № 811 от 16.03.2022 по изготовлению средств наружной информации согласно приложению к договору на сумму 31,7 тыс. рублей. Исполнитель обязуется оказать услуги в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора. На проверку представлен счет № 336 от 05.04.2022 и товарная накладная № 397 от 07.04.2022 года. Согласно части 3.2. договора оплата производится на расчетный счет исполнителя в срок не более 15 рабочих дне после поставки на основании товарной накладной. Оплата произведена платежными поручениями от:

- 08.04.2022 № 265 в сумме 3,1 тыс. рублей,
- от 15.04.2022 № 320 в сумме 7,5 тысяч рублей,
- от 15.04.2022 года № 321 в сумме 21,1 тысяч рублей.

2) Между МКОУ ООШ с. Полом в лице директора Смирновой А.В. и ИП Масленников А.А. в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 № 44-ФЗ заключен договор подряда № 1 от 04.04.2022 на выполнение работ по ремонту кабинетов физики и химии (пол) на сумму 271,4 тысяч рублей. Начало выполнения работ с момента заключения договора до 10 августа 2022 года.

На проверку представлен акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) от 23.06.2022 года и счет на оплату работ от 23.06.2022 № 1. Согласно части 4.1. договора оплата выполненных работ производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца на основании выставленного счета в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС-2 и КС-3. Оплата произведена платежным поручением от 29.06.2021 № 547 в сумме 271,4 тысяч рублей.

В ходе выездной проверки по состоянию на 13.10.2022 года установлено, что ремонтные работы выполнены согласно прилагаемой сметы и актов выполненных работ, в сроки, установленные контрактом. Линолеум уложен, таблички и стенды висят на стенах, функционируют.

II. Между Министерством образования Кировской области и администрацией Кирово-Чепецкого района заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятий физической культурой и спортом от 20 января 2022 года № 33618000-1-2022-006.

Общий объем финансирования на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом предусмотрен в бюджете Кирово-Чепецкого района решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 17.12.2021 № 04/30 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в сумме 1609,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета — 1577,62 тыс. рублей,
- областного бюджета — 15,98 тыс. рублей,
- местного бюджета -16,1 тыс. рублей.

Расходные обязательства муниципального образования установлены муниципальной программой «Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района», утвержденной постановлением администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области от 10.09.2018 № 159.

Проверка освоения бюджетных средств на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом проведена в МКОУ Краснооктябрьская ООШ д. Чуваши:

На выполнение работ по капитальному ремонту помещений спортивного зала и раздевалок муниципального казенного общеобразовательного учреждения Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа деревни Чуваши Кирово-Чепецкого района в лице директора Пивоварова Е.С. заключен муниципальный № 034020003322001402 от 25 марта 2022 года с ИП Четвериков А.М. в сумме 1 581 207,89 рублей. (Дополнительные соглашения от 10.06.2022 на увеличение цены контракта до 1 589 153,66 рублей и от 14.07.2022 на уточнение реквизитов заказчика и подрядчика).

Локальная смета № 533 на сумму 1589153,66 рублей проверена КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» по объекту (договор см-1446 от 24.12.2021), сметная стоимость определена достоверно.

Согласно условиям контракта, подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту помещений спортивного зала и раздевалок МКОУ Краснооктябрьская ООШ д. Чуваши в срок до 10 августа включительно.

На основании части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт расторгнут по соглашению сторон от 19.07.2022 года. Фактически работы по ремонту спортивного зала выполнены на сумму 795 572,4 рублей.

На проверку представлены акт выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3 от 26.06.2022 года (отчетный период с 01.04.2022 по 26.06.2022) в сумме 795,572 тыс. рублей, счет 10 от 26.06.2022 года.

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме платежным поручением № 138 от 15.07.2022 года в сумме 795 572,4 рублей.

На основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений спортивного зала и раздевалок между в лице директором школы Е.С. Пивоварова и ИП Четвериков А.М. заключен договор №1 от 21.07.2022 года на сумму 599 314,02 рублей. Срок окончания выполнения работ - до 10.08.2022 года.

На проверку представлены акт выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3 от 03.08.2022 года (отчетный период с 21.07.2022 по 03.08.2022) в сумме 599,314 тыс. рублей, счет 19 от 03.08.2022 года.

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме платежным поручением № 189 от 17.08.2022 года в сумме 599 314,02 рублей.

На основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений спортивного зала и раздевалок между в лице директором школы Е.С. Пивоварова и ООО «Стелпласт» в лице директора Стукова Н.А. заключен договор № 2 от 22.07.2022 года на сумму 214 813,58 рублей. Срок окончания выполнения работ - до 10.08.2022 года.

На проверку представлены акт выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3 от 03.08.2022 года (отчетный период с 22.07.2022 по 03.08.2022) в сумме 214,813 тыс. рублей, счет 2266 от 03.08.2022 года.

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме платежным поручением № 190 от 17.08.2022 года в сумме 214 813,02 рублей.

Общая стоимость выполненных работ по ремонту помещений спортивного зала и раздевалок муниципального казенного общеобразовательного учреждения Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа деревни Чуваши Кирово-Чепецкого района составила 1 609 700,0 рублей.

Условия соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий фи-

зической культурой и спортом от 20 января 2022 года № 33618000-1-2022-006 выполнены.

Во исполнение части 3.2.ж. директором школы Е.С.Пивоваровым утвержден приказ от 26.08.2021 года № 53 «О создании школьного спортивного клуба».

Услуги строительного контроля по ремонту спортивного зала осуществлялись на основании соглашения № 39 от 24.03.2022 года с КОГКУ «УКС» на безвозмездной основе (часть 1.4 Соглашения).

В ходе выездной проверки по состоянию на 13.10.2022 года установлено, что работы по ремонту помещений спортивного зала и раздевалок школы д. Чуваши выполнены согласно прилагаемой сметы и актов выполненных работ, в сроки, установленные муниципальным контрактом и заключенными договорами. Нарушений не установлено.

Выводы

1. В 2022 году на территории Кирово-Чепецкого района в рамках 3-х региональных (национальных) проектов, реализуется 6 федеральных проекта (далее — проекты).

Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов за счет консолидированного бюджета Кирово-Чепецкого по состоянию на 01.10.2022 составил 14364,9 тыс. рублей.

2. Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 9 месяцев 2022 год составили 13292,4 тыс. рублей, или 92,5% от годового плана.

Освоение бюджетных средств за 9 месяцев текущего года в объеме 100% от первоначального плана достигнуто при реализации национальных проектов «Культура» и «Образование».

За 9 месяцев текущего года освоение бюджетных средств в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» составило 4702,9 тыс. рублей или 81,4% плановых назначений.

3. Проведена последующая проверка по факту устранения нарушений, выявленных в ходе мониторинга национальных проектов за 1 полугодие текущего года по реализации мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда» в Бурмакинском и Кстининском сельских поселениях:

3.1. Проверка исполнения работ по обустройству сквера Победы «Набат» с выездом на объект по состоянию на 06.10.2022 года показала, что работы в рамках муниципального контракта, заключенного с ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА ГРУПП» выполнены с нарушением сроков на 14 дней. Работы в рамках договора на оказание услуг по монтажу уличного освещения на территории Сквера Победы «Набат», заключенного с ИП Огородов А.Г. произведены согласно техническому заданию, в установ-

ленный договором срок. Однако, оплата выполненных произведена с нарушением срока, установленного частью 3.2 договора.. Претензии со стороны исполнителя не поступало.

3.2. Проверка исполнения работ по обустройству спортивного комплекса на стадионе с. Кстинино по состоянию на 06.10.2022 года показала, что администрацией сельского поселения заключен прямой муниципальный контракт № 3-2022 с ООО «Мир металла и камня» на устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня на баскетбольной площадке в сумме 142,749 тысяч рублей. Исполнителем нарушен срок исполнения данного контракта. Претензия со стороны «Заказчика» - администрации Кстининского сельского поселения в адрес ООО «Мир металла и камня» о предъявлении штрафных санкций не направлена, что является нарушением 5.2-5.5.13 муниципального контракта. По состоянию на 11 октября размер неустойки, подлежащий к зачислению в бюджет Кстининского сельского поселения составляет 419,1 рублей.

В нарушение статьи 451, 452 Гражданского кодекса Российской Федерации дополнительное соглашение об изменении срока окончания работ исполнения муниципального контракта № 3-2022 от 19.07.2022 года не составлялось и сторонами не подписывалось.

По состоянию на 11.10.2022 года работы по обустройству выравнивающих слоев оснований из щебня не завершены, тем самым Подрядчиком нарушена часть 1.4. муниципального контракта № 3-2022 от 19.07.2022 года.

Кроме того, в нарушение части 3.2.е) соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды из областного бюджета местному бюджету от «31» января 2022 г. № 33618420-1-2022-001, локальный сметный расчет № 5/2 от 17.07.2022 на обустройство спортивного комплекса на стадионе с.Кстинино ул.Спортивная 2а на сумму 142,749 тысяч рублей, проверке достоверности определения сметной стоимости не подвергался.

4. Проведена проверка достижения результатов реализации мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МКОУ ООШ с. Поллом. Выполнены работы по ремонту кабинетов физики и химии (пол) на сумму 271,4 тысяч рублей. Нарушений не установлено.

5. Проверка освоения бюджетных средств на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом проведена в МКОУ Краснооктябрьская ООШ д. Чуваши. Общая стоимость выполненных работ по ремонту помещений спортивного зала и раздевалок муниципального казенного общеобразовательного учреждения Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа деревни Чуваши

Кирово-Чепецкого района составила 1 609 700,0 рублей. Нарушений не установлено.

Предложения

1. В целях повышения эффективности реализации региональных (национальных) проектов и их выполнения в установленные сроки, рекомендую ответственным исполнителям в 2022 году принять исчерпывающие меры, направленные на:

- своевременное выполнение мероприятий в рамках реализации региональных проектов (в том числе заключение и исполнение контрактов (договоров);

- исключение потери финансирования из федерального и областного бюджета и дополнительных расходов местного бюджета.

2. Главе Кстининского сельского поселения Вотинцеву А.А. принять меры к устранению выявленных нарушений.

Продолжить реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019-2025 годы»

О принятых мерах и достигнутых результатах сообщить в Контрольно-счетную комиссию района в срок до 15.11.2022 года в письменном виде.

Председатель
Контрольно-счётной комиссии
Кирово-Чепецкого района

Н.А. Порина
