



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**  
ул. Первомайская, 6, г. Кирово-Чепецк., 613040, тел.: (83361) 4-91-37,  
E-mail: [ksk\\_adm@mail.ru](mailto:ksk_adm@mail.ru)

---

Утверждено  
распоряжением председателя  
Контрольно-счетной комиссии  
от 20.07.2023 № 29

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по итогам проведения мониторинга реализации региональных  
(национальных) проектов за 1 полугодие 2023 года**

**№ 50**

**от 20.07.2023**

В соответствии с пунктом 16 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии района на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии района от 15.12.2022 № 56, Контрольно-счетной комиссией Кирово-Чепецкого района проведен мониторинг реализации проектов за 1 полугодие 2023 года.

### **Анализ расходов, направленных на реализацию региональных (национальных) проектов**

В 2023 году на территории Кирово-Чепецкого района в рамках 5-ти национальных (региональных) проектов, реализуется 6 федеральных (региональных) проектов (далее — проекты).

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году проектов за счет консолидированного бюджета Кирово-Чепецкого по состоянию на 19.07.2023 года составил 7686,4 тыс. рублей.

Решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 23.12.2022 № 15/94 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 21.04.2023 №19/126, от 19.07.2023 № 22/145) на реализацию проектов «**Культура**», «**Образование**» и «**Демография**» (**Спорт — норма жизни**) предусмотрено 5396,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4377,19 тыс. рублей, областного бюджета 965,7 тыс. рублей и местного бюджета — 54,0 тыс. рублей.

Средства на реализацию национального (регионального) проекта

«Жильё и городская среда» (Сокращение непригодного для проживания жилья) предусмотрены решением Кстининской сельской Думы от 23.12.2022 № 04/15 «О бюджете Кстининского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024- 2025 гг» (с изменениями) в сумме **983,1 тыс. рублей**, в том числе федеральный бюджет — 973,2 тыс. рублей, областной бюджет 8,9 тыс. рублей, местный бюджет — 1,0 тыс. рублей.

Решением Мокрецовской сельской Думы 23.12.2022 № 5/18 «О бюджете Мокрецовского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» предусмотрено средств на реализацию проектов в сумме 1467,6 тыс. рублей, в том числе средства на реализацию национального проекта:


- «**Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области**» в сумме **1306,5 тыс. рублей**, в том числе федеральный бюджет — 1280,5 тыс. рублей, областной бюджет 12,9 тыс. рублей, местный бюджет — 13,1 тыс. рублей;

- «**Культура**» ("Творческие люди") в сумме **161,1 тыс. рублей**, в том числе федеральный бюджет — 150,0 тыс. рублей, областной бюджет 9,6 тыс. рублей, местный бюджет — 1,6 тыс. рублей.

Решением Пасеговской сельской Думы от 26.12.2022 № 06/22 «О бюджете Пасеговского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены средства на реализацию национального проекта «**Культура**» ("Творческие люди") предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 107,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет — 100,0 тыс. рублей, областной бюджет 6,4 тыс. рублей, местный бюджет — 1,0 тыс. рублей.

Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 1 полугодие 2023 год составили 3472,9 тыс. рублей, или 45,2% от годового плана.

Объем финансирования в 2023 году на реализацию региональных (национальных) проектов, тыс. рублей

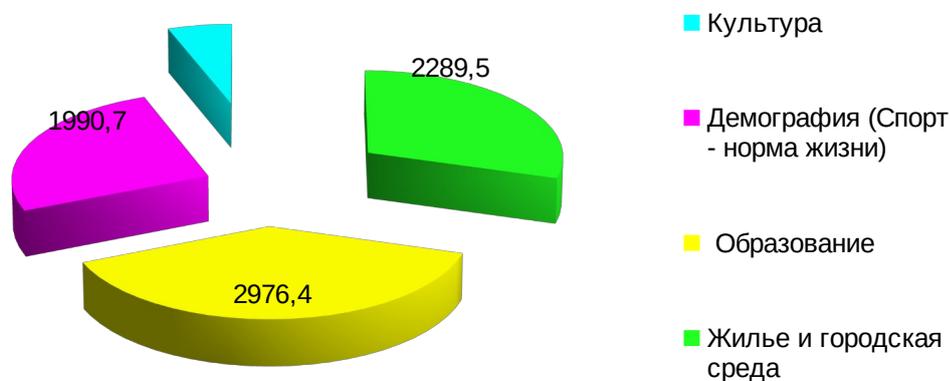

тыс. рублей

№ п/п	Наименование проекта	Плановые назначения				Исполнено в 1 полугодии	% исполнения
		Всего	в том числе: федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		
<b>Национальный проект «Культура»</b>							
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области"							
1	«Творческие люди»	429,8	399,99	25,5	4,3	429,8	100
	<b>Итого НП «Культура»</b>	<b>429,8</b>	<b>399,99</b>	<b>25,5</b>	<b>4,3</b>	<b>429,8</b>	<b>100</b>
<b>Национальный проект «Образование»</b>							
Региональный проект «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи»							
2	Патриотическое воспитание	2067,1	2025,9	20,5	20,7	1150,76	55,7
Национальный проект «Образование», федеральный проект «Современная школа»							
3	Современная школа	909,3	0	900	9,3	909,3	100
	<b>Итого НП «Образование»</b>	<b>2976,4</b>	<b>2025,9</b>	<b>920,5</b>	<b>30,0</b>	<b>2060,1</b>	<b>69,2</b>
<b>Национальный проект «Жильё и городская среда»</b>							
4	Сокращение непригодного для проживания жилья	983,0	973,2	8,86	1,0	983,00	100
региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»							
5	Комфортная городская среда	1306,5	1280,5	12,9	13,1	0	0
	<b>Итого НП «Жильё и городская среда»</b>	<b>2289,5</b>	<b>2253,7</b>	<b>21,76</b>	<b>14,1</b>	<b>983,0</b>	<b>42,9</b>
<b>Национальный проект «Демография»</b>							
6	Спорт — норма жизни	1990,7	1951,3	19,7	19,7	0	0
	<b>Итого НП «Демография»</b>	<b>1990,7</b>	<b>1951,3</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Всего по региональным (национальным) проектам</b>	<b>7686,4</b>	<b>6630,84</b>	<b>987,46</b>	<b>68,1</b>	<b>3472,9</b>	<b>45,2</b>

Освоение бюджетных средств в объеме 100% от первоначального плана достигнуто при реализации:

- федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры, по государственной поддержке лучших работ-

ников сельских учреждений культуры государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» в сумме 429,85 тыс. рублей;

- федеральный проект «Современная школа», в рамках подготовки общеобразовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в сумме 909,3 тыс. рублей,

- федеральный проект «Сокращение непригодного для проживания жилья» на приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих на территории Кстининского сельского поселения из аварийного жилищного фонда, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» в сумме 983,0 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2023 года исполнение расходов в объеме 55,7% от годового плана сложилось по реализации национального проекта «Образование» по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в рамках подпрограммы «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи» в сумме 1150,76 тыс. рублей.

По федеральному проекту «Комфортная городская среда» освоения бюджетных средств в период январь - июнь текущего года не было.

В период с января по июль текущего года для освоения бюджетных средств заключено 15 муниципальных контрактов (договоров) на 6110,1 сумму тыс. рублей, в том числе:

1) НП «Культура» заключено 5 контрактов (договоров) на сумму 289,9 тыс. рублей или 98,6% от общего объема финансового обеспечения реализации государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры;

2) НП «Образование» - 7 контрактов (договоров) на сумму 909,3 тыс. рублей или 100% от общего объема финансового обеспечения реализации проекта по направлению «Точка роста» в рамках проекта «Современная школа»;

3) НП «Демография» - 1 муниципальный контракт в рамках проекта «Спорт — норма жизни» на сумму 1990,7 тыс. рублей или 100% от общего объема финансового обеспечения реализации проекта;

4) На реализацию национального (регионального) проекта «Жильё и городская среда» - 2 муниципальных контракта на сумму 2920,2 тыс. рублей, в том числе:

- «Сокращение непригодного для проживания жилья» — 1 муниципальный контракт на приобретение жилых помещений для переселения гра-

ждан, проживающих на территории Кстининского сельского поселения из аварийного жилищного фонда, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на сумму 983,0 тыс. рублей или 100,0% от общего объема финансового обеспечения реализации проекта;

- «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» - 1 муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству «Сквера Победы» в с.Каринка ул.Школьная на сумму 1937,2 тыс. рублей или 100,0% от общего объема финансового обеспечения реализации проекта.

**Проверка соблюдения сроков (графиков) выполнения работ, услуг в рамках исполнения региональных проектов, предусмотренных контрактами (договорами).**

I. Проведена проверка достижения результатов НП «Демография» рамках проекта «Спорт — норма жизни» направленного на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры (далее - региональный проект), в целях достижения результатов регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области".

Между Министерством спорта и туризма Кировской области и администрацией Кирово-Чепецкого района заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «31» января 2023 г. № 33618000-1-2019-005 (с изменениями, внесенными дополнительным соглашением № 33618000-1-2019-005/2) на сумму 1990,7 тыс. рублей.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Кирово-Чепецкого района, утвержденный решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 23.12.2022 № 15/94 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района», утверждённой постановлением администрации района от 10.09.2018 № 155 составляет 1990,7 тыс. рублей (изменения внесены решением районной Думы от 19.07.2023 № 22/145 «О внесении изменений в решение Кирово-Чепецкой районной Думы от 23.12.2022 № 15/94 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 1951,3 тыс. рублей,
- областного бюджета — 19,7 тыс. рублей,

- местного бюджета -19,7 тыс. рублей.

На момент проведения мониторинга, изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области от 10.09.2018 №155 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района", не внесены.

Планом мероприятий («дорожной картой») в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» запланировано строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием для создания малой спортивной площадки ГТО на территории Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района.

Аукционная документация стоимостью 2 829 440,00 рублей проверена в ОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» от 28.02.2023 №01-01-00447.

На реализацию проекта «Спорт — норма жизни» посредством проведения электронного аукциона Управлением культуры администрации Кирово-Чепецкого района заключен муниципальный контракт № 0340200003323002627 от 27.03.2023 с индивидуальным предпринимателем Семенов И.А. на сумму 1990,7 тыс. рублей.

Экономия от проведения электронного аукциона составила 838,74 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением № 2 от 30.06.2023 года к муниципальному контракту № 0340200003323002627 от 27.03.2023 на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок руководствуясь частью 7 статьи 95 Закона № 44 -ФЗ стороны пришли к соглашению о поставке товара, качество, технические характеристики (потребительские свойства) которого улучшаются по 9 позициям.

Частью 4.3.12. Соглашения от «31» января 2023 г. № 33618000-1-2019-005 установлено, что заключение контрактов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением (дополнительным соглашением), необходимо в срок до 1 апреля 2023 года, а также *обеспечить освоение средств Субсидии не менее 50% в срок до 1 июля 2023 года.*

*По состоянию на 19.07.2023 года освоения денежных средств в рамках реализации муниципального контракта № 0340200003323002627 от 27.03.2023 не было, что является нарушением части 4.3.12. Соглашения от «31» января 2023 г. № 33618000-1-2019-005.*

Частью 1.2. муниципального контракта установлены сроки поставки и монтажа оборудования: не ранее 05.06.2023 и по 30.06.2023 включительно. Поставщик осуществляет поставку и монтаж Товара Заказчику по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с.Кстинино, ул.Спортивная 2А. (часть 1.5. муниципального контракта).

*В нарушение части 1.2. муниципального контракта по состоянию на 18.07.2023 года работы по установке и монтажу оборудования не завершены. КС-2 и КС-3 не составлялись.*

Управлением культуры администрации района в адрес подрядчика ИП Семенова И.А. направлено требование № 126 от 30.06.2023 об уплате неустойки (штрафов, пеней) в связи с неисполнением обязательств предусмотренных муниципальным контрактом.

II. Проведена последующая проверка по факту устранения нарушений, выявленных в ходе мониторинга национальных проектов за 2022 год при реализации мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда» в Кстининском сельском поселении.

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019-2025 годы», направленной на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Кстининском сельском поселении.

Между министерством строительства Кировской области и администрацией Кстининского сельского поселения заключено соглашение о предоставлении местным бюджетам субсидии из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 13 марта 2023 года № 15-2023/А.

Предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2023 году/2024 и 2025 годах (по заявке 2022 года) бюджету Кстининского сельского поселения субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Решением Кстининской сельской Думы от 23.12.2022 № 04/15 «О бюджете Кстининского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024- 2025 гг» предусмотрены средства на переселение граждан в сумме 983,1 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет — 973,2 тыс. рублей, областной бюджет 8,9 тыс. рублей и местный бюджет — 1,0 тыс. рублей.

Посредством проведения аукциона на покупку жилого помещения между администрацией Кстининского сельского поселения ии ООО «Партнер» заключен муниципальный контракт от 20.06.2023 года № 0340200003323007235 на приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих на территории Кстининского сельского поселения из аварийного жилищного фонда, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» стоимостью 983,1 тыс. рублей.

Местонахождение жилого помещения: Кировская область, г. Киров, Ленинский район, мкр. Лянгасово, улица Гражданская дом 33, квартира 91.

Жилое помещение расположено на 5 (пятом) этаже многоквартирного дома, имеет общую площадь 26,5 кв.м. Жилое помещение принадлежит Продавцу Клабуковой Ирине Анатольевне на праве собственности на основании договора купли-продажи от 11.04.2023, что подтверждается Выпиской из ЕГРН от 13.04.2023, сделана запись регистрации №43:40:002037:109-43/079/2023-4.

Для переселения гражданина Ганиева М.М., собственника квартиры, признанной непригодной для проживания и подлежащей сносу (расположенной по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Кстинино, ул.Советская, 69, кв.2) администрацией сельского поселения заключен договор мены от 03.07 2023 года.

Стороны совершили мену принадлежащих на праве собственности жилых помещений, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 05.07.2023 года.

Нарушений не установлено.

## **Выводы**

1. В 2023 году на территории Кирово-Чепецкого района в рамках 4-х региональных (национальных) проектов, реализуется 6 федеральных проекта (далее — проекты).

Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов за счет консолидированного бюджета Кирово-Чепецкого по состоянию на 01.07.2023 составил 7686,4 тыс. рублей.

2. Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 1 полугодие 2023 год составили 3472,9 тыс. рублей, или 45,2% от годового плана.

Освоение бюджетных средств в объеме 100% от первоначального плана достигнуто при реализации федеральных (региональных) проектов:

- «Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")»;
- «Современная школа»;
- «Сокращение непригодного для проживания жилья».

По итогам 1 полугодия 2023 года исполнение расходов в объеме 1150,76 тыс. рублей или 55,7% годового плана сложилось по реализации национального проекта «Образование» по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в рамках подпрограммы «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи».

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» освоения бюджетных средств в период январь - июнь текущего года не было.

3. В период с февраля по июнь текущего года для освоения бюджетных средств заключено 15 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 6110,1 тыс. рублей.

4. Выборочной проверкой реализации НП «Демография» рамках проекта «Спорт — норма жизни» направленного на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры, установлены нарушения:

- пункта 4.3.12. Соглашения от «31» января 2023 г. № 33618000-1-2019-005 в части не обеспечения освоения средств Субсидии *(не менее 50% в срок до 1 июля 2023 года)*;

- пункта 1.2. муниципального контракта № 0340200003323002627 от 27.03.2023 года в части нарушения сроков поставки и монтажа оборудования *(не ранее 05.06.2023 и по 30.06.2023 включительно)*.

5. В первом полугодии текущего года администрацией Кстининского сельского поселения по заявке 2022 года произведена покупка жилого помещения для переселения граждан, проживающих на территории Кстининского сельского поселения из аварийного жилищного фонда, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года». По договору мены от 03.07 2023 года из аварийного жилого дома гражданин Ганиев М.М. переселен по адресу Кировская область, г. Киров, Ленинский район, мкр. Лянгасово, улица Гражданская дом 33, квартира 91. Нарушений не установлено.

### **Предложения**

1. Продолжить работу по реализации региональных (национальных) проектов на территории Кирово-Чепецкого района.

2. Управлению культуры администрации Кирово-Чепецкого района принять действенные меры к освоению денежных средств на реализацию проекта «Спорт — норма жизни».

В срок до 19.08 2023 года внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, молодёжной политики и спорта Кирово-Чепецкого района», утверждённую постановлением администрации района от 10.09.2018 № 155 в сторону снижения на сумму экономии от электронного аукциона 839,6 тыс. рублей.

Председатель  
Контрольно-счётной комиссии  
Кирово-Чепецкого района

Н.А. Порина
